

JOSÉ LUIS VÁZQUEZ MARTÍNEZ

Tangancícuaro, Michoacán.

09 de Agosto del 2019

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

En la comunidad de Buena Vista, perteneciente al municipio de Tangancícuaro, Mich. Siendo las 12:00 horas del día 09 de Agosto del 2019, se reunieron el ARQ. JOSÉ RAMÓN TRUJILLO AGUILAR y el ING. ARQ. JOSÉ MA. MURGUÍA ARROYO director de obras públicas y supervisor de obras públicas del H. Ayuntamiento de Tangancícuaro respectivamente, así como el contratista JOSÉ LUIS VÁZQUEZ MARTÍNEZ, con el objeto de hacer constar la terminación de la obra "CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL "LÁZARO CÁRDENAS" EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO MICHOACÁN" según contrato No. AYTTO/TANGANCICUARO/2019/OP/FIII/(010) de fecha del 14 de Junio del 2019, con un importe de \$649,602.97 (SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOS PESOS 97/100 M.N.)

Terminando el total de los trabajos el día 09 de Agosto del 2019, teniendo como alcance de la obra la cantidad de \$649,602.97 (SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOS PESOS 97/100 M.N.) I.V.A. incluido.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES	MONTO
Anticipo (0%)	\$ 0.00
Estimación 1	\$ 192,368.92
Estimación 2 y Finiquito	\$ 457,234.05
Alcance	\$ 649,602.97



JOSÉ LUIS VÁZQUEZ MARTÍNEZ

Descripción de los conceptos:


CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
A-1	CIMENTACIÓN		
1	Limpia, trazo y nivelación topográfica de terreno para edificios, estableciendo ejes y referencias incluye despalle de la superficie con un espesor mínimo de 20 cms	m2	82.62
2	Excavación por medios manuales, para retiro de capa contaminada dentro de aulas, material seco tipo B profundidad promedio de 30 cm	m3	24.79
3	Relleno con material de banco (material inerte despalle)	m3	24.79
4	Firme de concreto de 10 cm de espesor reforzado con malla electrosoldada 6-6/10-10 de concreto f'c=200 kg/cm2 agregado 3/4"	m2	82.62
A-2	ALBAÑILERÍA Y ACABADOS		
5	Losa plana en estructura peralte = 13 cm cimbra común reforzada con 72 kg de acero por m3, concreto f'c=250-3/4", acabado aparente	m2	135.33
6	Forjado de nariz de concreto f'c=150kg/cm2, de 10x10 cm para remate de piso en zona posterior y laterales del edificio, incluye cimbrado, descimbrado, materiales, mano de obra y herramienta	m	27.30
7	Impermeabilización asfáltica en caliente en azoteas a base de asfalto modificado prefabricado SBS de 3.5 mm de espesor especificación CAPFCE incluye aplicación de primer asfáltico y sellado de grietas y fisuras con cemento plástico asfáltico garantía escrita 5 años mínimo	m2	135.33
8	Aplanado en muros con mezcla mortero-arena 1:3 de 1.5 cm de espesor promeido incluye boquillados y acabado fino	m2	252.15
9	Afinación de firmes de 4 cm de espesor para recibir vitropiso incluye materiales y mano de obra	m2	82.62
10	Vitropiso de primera calidad, de 33 x 33 cm asentado con pegapiso y junteado con junteador	m2	82.62
11	Zodo de vitropiso de 8.5 cm de altura incluye materiales y mano de obra	m	86.75
12	Pintura vinílica en muros, trabes y plafones incluyendo una mano de sellador vinílico comex, 2 manos de pintura vinílica vinimex y preparación de la superficie, resanes y rebabeos	m2	387.48
A-3	HERRERÍA		
13	Suministro y colocación de cancelería de aluminio natural de 2" corrediza, incluye vidrio de 6mm, materiales, mano de obra y herramienta	m2	20.24
14	Suministro y colocación de puerta mutypanel de 1.00 x 2.50 mt con marco de aluminio, incluye chapa mca Phillips mod-525 y todo lo necesario para su buen funcionamiento	pza	2.00
15	Suministro y colocación de cerradura en puerta	pza	2.00
A-4	INSTALACIÓN ELÉCTRICA		
16	Suministro y colocación de un centro de carga de una pastilla (una salida) incluye materiales y mano de obra	sal	1.00
17	Suministro y colocación de apagador sencillo dos piezas en una chalupa	sal	4.00
18	Suministro y colocación de contacto sencillo doble	sal	6.00
19	Cableado exterior con cable thw-8 desde el murete eléctrico hasta el tablero de control	m	20.00
20	Suministro y colocación de luminaria fluorescente de sobre poner 2x32 w incluyendo bases, tubos, balastra, difusor, gabinete y material de fijación	pza	10.00
A-5	BANQUETA		
21	Limpia, trazo y nivelación topográfica de terreno para edificios, estableciendo ejes y referencias incluye despalle de la superficie con un espesor mínimo de 20 cms	m2	12.72
22	Excavación por medios mecánicos incluye afine de taludes y fondo, material seco tipo B profundidad promedio de 0.30 m	m3	3.82
23	Cadena de concreto f'c=250 kg/cm2 de 14x20 cm armado con 4 var del no. 3 y est. No 2 a cada 15 cm incluye cimbra común 2 caras, descimbrado, materiales, mano de obra y herramienta	m	13.00
24	Relleno con material de banco (material inerte despalle)	m3	3.82
25	Banqueta de concreto hidráulico f'c=200kg/cm2 de 10cm de espesor T.M.A. 3/4" acabado escobillado	m2	12.72
A-6	LIMPIEZA		
26	Limpieza en edificaciones terminadas y amuebladas de materiales vidriados (azulejos, cintillas, etc) en pisos con solución agua, detergente en polvo y ácido muriático	m2	102.86
A-7	RAMPA		
27	Cadena de concreto f'c=250 kg/cm2 de 14x20 cm armado con 4 var del no. 3 y est. No 2 a cada 15 cm incluye cimbra común 2 caras, descimbrado, materiales, mano de obra y herramienta	m	7.10
28	Relleno con material de banco (material inerte despalle)	m3	5.31
29	Rampa de concreto f'c=200kg/cm2 de 10cm de espesor tma 3/4" acabado escobillado	m2	7.08




JOSÉ LUIS VÁZQUEZ MARTÍNEZ

En este acto el contratista garantiza y queda obligado a responder de los defectos que resulten de la realización de la obra objeto de este contrato, de los vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubieran incurrido en su ejecución hasta los 12 meses a partir de la fecha de recepción de la obra.

RECIBE POR EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TANGANCICUARO 2018-2021:

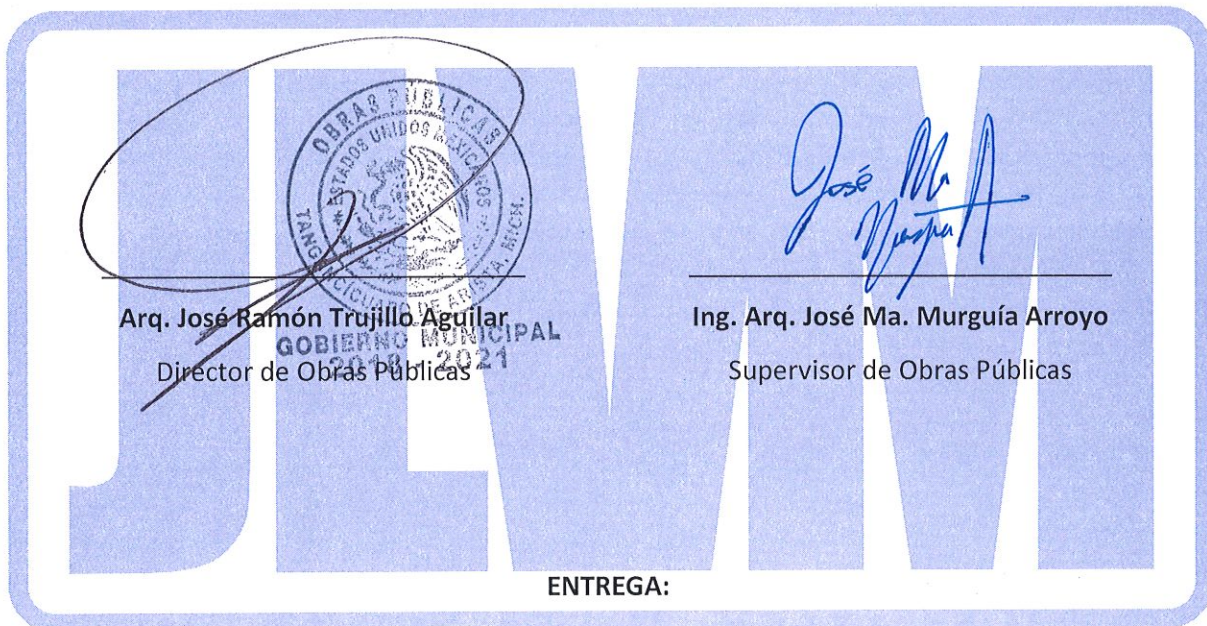

ENTREGA:


José Luis Vázquez Martínez

Contratista
